COMUNE DI TOLLO
PROVINCIA DI CHIETI

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ALVEO DEL FIUME ARIELLI E DEL TORRENTE VENNA

Progetto Definitivo - Esecutivo

Planimetria delle aree e delle piste di cantiere
accantieramento - stoccaggio mezzi e materiali

COORDINATORE DELLA SICUREZZA:
geom. Gino Scoletti

11/08/2022

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
ing. Nicola Mascianti
ing. Nicola Mascianti
geom. Tam Giandomenico Scoletti
geom. Gino Scoletti

AREA CANTIERE SU AEROFOTO

Individuazione tratto di cantiere lungo fiume Arielli su tracciato pista ciclabile esistente da utilizzare come viabilità interna di cantiere con chiusura al traffico per tutta la durata dei lavori

X **Area accantieramento**
Area parcheggio mezzi
Area deposito materiali

VIABILITA' DI CANTIERE

A-B Il cantiere è tutto lungo il Fiume Arielli che è costeggiato da una pista ciclabile/carrabile con fondo in misto frantoiato rullato che verrà utilizzata come strada interna di cantiere previa chiusura al traffico per tutto il periodo dei lavori - larghezza media 3,00-4,00 mt.

X AREA ACCANTIERAMENTO AREA PARCHEGGIO MEZZI AREA DEPOSITO MATERIALI

Verrà utilizzata un'area di proprietà comunale già recintata costituita dalla parte libera all'interno dell'impianto di depurazione ubicato di fianco il cantiere e lungo la pista esistente da utilizzare come viabilità - l'area è altresì fornita di energia elettrica ed acqua potabile - estensione mq. 1.200,00

ACCANTIERAMENTO

-BOX UFFICI CANTIERE
-BOX SERVIZI OPERAI spogliatoio-mensa-medicinali-DPI
-BAGNO CHIMICO a tenuta senza scarico

PARCHEGGIO MEZZI IMPIEGATI IN CANTIERE

-AUTOBETONIERA
-AUTOPOMPA PER GETTO CLS
-BETONIERA MANUALE
-ESCAVATORE CINGOLATO
-AUTOPOMPA PER GETTO CLS
-MINIESCAVATORE CINGOLATO
-RULLO COMPRESSORE
-MINICARICATORE GOMME
-GRUPPO ELETTROGENO CON FARI
-UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE
-SEGNALETICA DI CANTIERE
-FUORISTRADA

DEPOSITO MATERIALI DA UTILIZZARE
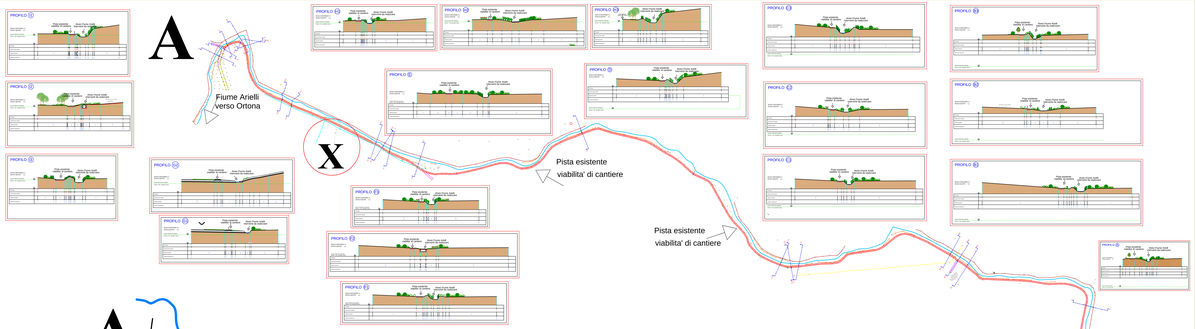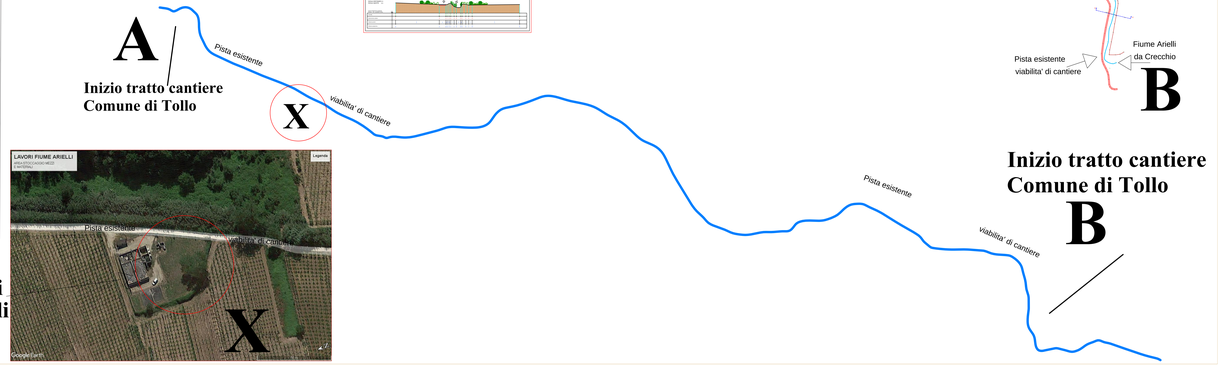
-INERTI - sabbia, frantoiato, stabilizzato
-PIETRE DI PICCOLA E GROSSA PEZZATURA per gabbionate
-MASSI GROSSA PEZZATURA scogli 2° e 3° cat. per consolidamento sponde fiume
-GABBIE METALLICHE per gabbionate da montare in loco
-GEOTESSILE NON TESSUTO
-BARRE DI acciaio ad aderenza migliorata
-STACCIONATA IN LEGNO a croce di Sant'Andrea
