



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA
UFFICIO TECNICO DI PESCARA

PAR FAS Abruzzo 2007 - 2013

Linea di Azione IV.2.1.a

"Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale"

Intervento 2

"Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali"

| | |
|--|--|
| TITOLO INTERVENTO: Rafforzamento e riprofilatura argini e interventi di ingegneria naturalistica sul Fiume Pescara in località "Salvatezzi" nel comune di Chieti (CH).- -CUP:c72j12000190001 -CIG:5814820d40 -IMPORTO LAVORI ORIGINARI AL NETTO DEL RIB. DEL 34,85% €. 218'556,74.= -IMPORTO LAVORI VARIANTE AL NETTO DEL RIB. DEL 34,85% €. 261'170,72.= | |
| PERIZIA DI VARIANTE | |
| Relazione tecnica | |
| Elab. 1 | <i>(Modifica di cui al parere n° 1588 del 04/02/2016 - Ministero Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle arti e Paesaggio dell'Abruzzo)</i> IL PROGETTISTA: - Ing. Silvio Iervese _____ - F.E.T. Bruno Baldonero _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Ing. Silvio Iervese _____ |
| Visto: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Ing. Vittorio Di Biase) | |
| Data: 21 NOV. 2016 | Prot.: |



REGIONE ABRUZZO

Servizio del Genio Civile di Pescara

DPG - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

Via Catalillo, 2 - (66127) Pescara - Tel. 085 65 341 / 2 - fax 085 45 18 770

PEC: dpd019@regione.abruzzo.it

www.abruzzo.it

Oggetto: : PAR FAS 2007-2013 - Azione Cardine "Rischi di Origine Naturale" Linea di azione

IV.2.1.a "Riduzione del Rischio derivante da fenomeni alluvionali, fronsi ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale - Intervento 2 – Riduzione del Rischio derivante da fenomeni alluvionali;

- **Opere di "rafforzamento e riprofilatura argini e interventi di ingegneria naturalistica sul Fiume Pescara in località "Salvalzezi" nel comune di Chieti"**

- **CIG: 5814820D40.**

- **CUP: C72J1200019000**

- **Impresa:** Antonelli Carrillo di Pennapiedimonte (CH).

- **Contratto:** rep. N°8545 del 27/01/2015.

- **Importo:** netto contrattuale dei lavori €:218556,74.=

-**IMPORTO LAVORI ORIGINALI AL NETTO DEL RIB. DEL 34,85% €:218556,74.=**

-**IMPORTO LAVORI VARIANTE AL NETTO DEL RIB. DEL 34,85% €:261170,72.=**

RELAZIONE TECNICA - VARIANTE

Premesso che:

- con Determinazione n° DC24/8 del 28/01/2014, è stato approvato il progetto esecutivo dall'Ufficio Tecnico di Pescara, per i lavori indicati in oggetto, della spesa complessiva di €:450'000,00 di cui €: 329'531,79 per lavori a misura, comprensivo di spese per la sicurezza pari a €:11095,48;
- a seguito dell'esito della gara del 15/07/2014 è stato aggiudicato l'appalto all'Impresa "Antonelli Carrillo" di Pennapiedimonte (CH), che ha offerto il ribasso del 34,85% per l'importo netto di €:218556,74, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- di seguito si è stipulato il contratto di appalto dei lavori in oggetto con la suddetta Impresa Appaltatrice registrato con rep. N°8545 del 27/01/2015 a Pescara.

- in data 17/06/2015 sono stati consegnati i lavori di cui sopra alla suddetta impresa " Antonelli Camillo" di Pennapiedimonte (CH), per la durata contrattuale di gg.180 consecutivi e pertanto scadenti il 13/12/2015;
- che in data 29/10/2015 con nota RA/272372 è stato inviato il progetto relativo alla "Perizia di Variante" del progetto in itinere, alla Regione Abruzzo – Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale, per le modifiche apportate al progetto originale, già trasmesso con nota n. 74 del 07/01/2014;
- che la Regione Abruzzo, Dipartimento Trasporti Mobilità Turismo e Cultura DPE – Servizio Governo del Territorio BB.AA. e Aree Protette, inviava con nota n.2253/BN/69022 il progetto "Perizia di Variante" al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, per il necessario parere di competenza ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, rispondeva alla nota precedente con lettera prot. 1588 del 04/02/2016, assunta al protocollo della Regione Abruzzo – Servizio Genio Civile Regionale di Pescara in data 18/02/2016 prot. RA/36316, con la quale chiedeva delle modifiche al progetto presentato nel rispetto di alcune prescrizioni che indicava nella nota suddetta.
- a seguito delle richieste della nota precedente il presente ufficio ha provveduto alla modifica del progetto in considerazione delle prescrizioni elencate, con la modifica di alcune sezioni dell'intervento. Infatti per rispettare un criterio di basso impatto ambientale si sono alternate, lungo il piano inclinato della parete fluviale, alcune sezioni costituite da scogli di 2a categoria, come da progetto originale, con altre realizzate tramite terrazzamenti composti da gabbioni in rete metallica e sovrastante parete realizzata con materassi metallici. Il tutto con inerbimento successivo mediante la semina di piante erbacee al fine della formazione di un colico erboso consolidante, in modo che tutto sia completamente di basso impatto ambientale e ben rispondendo al necessarie opere di consolidamento della parete fluviale. Tali opere rispondono così a quanto richiesto nella nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo.

Considerato che:

- le opere previste nel progetto sono state individuate e dimensionate di seguito a specifici rilievi e sulla base di considerazioni tecniche-scientifiche correlate alle risultanze dei sopralluoghi effettuati;
- gli interventi previsti rispondono a criteri di basso impatto ambientale, scaturiscono da tecniche di ingegneria naturalistica, sono rapportati ai valori naturalistici del paesaggio e sostanzialmente consistono:
 1. nella realizzazione di un argine in terra a basso impatto a protezione di strutture esistenti;
 2. pulizia, sistemazione e risagomatura alveo fluviale e sponde relative;

- nel corso dei lavori, di seguito alle ultime piene verificatesi negli ultimi mesi, si è avuto modo di constatare che l'alveo nel tratto interessato dall'intervento e in prossimità di un meandro, la sponda destra ha subito un'accentuata erosione che ha provocato uno sgrottamento con arretramento della sponda, interessando anche la strada di servizio che fiancheggia la stessa, per una lunghezza di c.a m.:51,00;
- che la diretta osservazione dei fenomeni e l'analisi degli effetti indotti dalle piene recenti segnalano la necessità di proteggere e rinforzare la sponda per rendere funzionale l'intero intervento alla naturale evoluzione del tratto di fiume in esame;
- che i lavori previsti nella variante rimangono sostanzialmente gli stessi della perizia originaria mentre per la parte in erosione si rende necessario la ricostruzione e il rafforzamento della sponda e più precisamente utilizzando le seguenti categorie di lavoro oltre a quelle già previste:
 - scavo a sezione obbligata;
 - f. e p.o. di gabbionate metalliche cilindriche per fondazione;
 - fornitura e posa in opera di scogli di 2ª cat;
 - ancoraggio della scogliera nella sponda;
 - inserimento di scarpe composte da gabbioni in rete metallica e sovrastante parete redilizzata con materassi metallici;
 - inerbimento con semina di piante erbacee per la formazione di un coticco erboso consolidante;
- Che tutte le categorie dei lavori e le modalità esecutive degli interventi previsti rispondono a criteri di basso impatto ambientale, scaturiscono da tecniche di ingegneria naturalistica, sono rapportati ai valori naturalistici del paesaggio e seguono le indicazioni e la tipologia di intervento così come evidenziate nel progetto originario.
- Che il valore complessivo stimato dei lavori complementari non supera il venti per cento dell'importo del contratto iniziale;

Considerato quanto sopra,

di sensi dell'art.132, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, e dell'art.161, comma 3 e 4, del Regolamento 207/2010, in sede di esecuzione dei lavori si è reso necessario procedere ai lavori suppletivi, al fine di rendere organicamente funzionale l'intervento in itinere in funzione delle verifiche effettuate.

Perizia di variante

Considerando che nel corso dei lavori, di seguito alle ultime piene verificatesi nei mesi antecedenti l'inizio dei lavori e subito dopo, si è avuto modo di constatare che l'alveo nel tratto interessato dall'intervento e in prossimità di un meandro, la sponda destra ha subito un'accentuata erosione che ha provocato uno sgrottamento e arretramento della sponda, interessando anche la strada di servizio che fiancheggia la stessa, per una estensione spondale di c.a m.:51,00;

In particolare è stato previsto la ricostruzione dell'argine eroso e sgrottato con il rinforzo del tratto (c.a m.51) mediante l'utilizzo di rocce naturali di 2a categoria tenute unite da un sistema di funi incrociate, mentre nel tratto fluviale consecutivo, si è previsto l'ampliamento della sistemazione delle sponde previste inizialmente, ricorrendo ulteriori tratti fluviali per la risgomatura delle sponde che risultano danneggiate.

Per quanto su esposto si ritiene di poter procedere ai sensi dell'art. 161, comma 3 e 4 del Regolamento 207/2010 e per l'art. 132/2006 comma 1 lett.b del Codice 163/2006, all'esecuzione dei maggiori lavori, agli stessi patti e condizioni del contratto originario poiché restando entro il 20% dell'importo d'appalto.

A tale scopo si è ravvisata l'opportunità di promuovere la redazione della presente perizia di variante illustrandone le motivazioni e ribadendo che le previsioni progettuali non vanno ad alterare sostanzialmente la natura dell'intervento previsto nella perizia principale.

La presente perizia di variante prevede l'importo finanziato di € 450.000,00 così suddiviso:

€ 261.170,72 = di netto del ribasso del 34,85% per lavori a misura, comprensivo di € 11.637,42 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la somma pari a € 78.829,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Pertanto, l'importo di variante per i lavori al netto del ribasso d'asta del 34,85% risulta essere di € 426.13,98 pari al 19,50% dell'importo del contratto originario dell'appalto che era di € 2.18556,74, quindi rientrante nel 20% dell'importo netto del contratto originario dell'appalto.

La perizia prevede fondamentalmente la rimodulazione di alcune quantità delle voci esistenti e l'utilizzo di nuovi prezzi concordati con verbale accettato e controfirmato dall'impresa appaltatrice, il tutto rientrando nella copertura finanziaria della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, come più precisamente viene specificato nel seguente quadro economico comparativo:

| QUADRO ECONOMICO | | PROGETTO ESECUTIVO | PERIZIA DI VARIANTE | DIFFERENZA MAGGIORA |
|------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|
| A) | LAVORI | | | |
| a1 | LAVORI A MISURA | € 329.531,79 | € 394.650,92 | € 65.119,13 |
| a2 | ONERI SICUREZZA (non soggetti a rib.) | € 11.095,48 | € 11.637,42 | € 541,94 |
| | IMPORTO CONTRATTUALE (m.34,85%) | € 218.556,74 | € 261.170,72 | € 42.613,98 |
| B) | SOMME A RIS. DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |
| 1 | LAVORI IN ECONOMIA | € 15.020,00 | € 0,00 | € -15.020,00 |
| 2 | BILI/VACUERAMENTI E INGANI | € 5.000,00 | € 0,00 | € -5.000,00 |
| 4 | IMPREVISTI | € 6.980,58 | € 0,00 | € -6.980,58 |
| 7 | SPESE ART.90 C.5 E 92 C.185 D.LGS. 163/2006 | € 6.690,64 | € 7.868,00 | € 1.177,36 |
| 7 | SPESE TECNICHE+ASSICURAZ. DIRETTO | € 6.000,00 | € 4.918,00 | € -1.082,00 |
| 7 | SPESE DI CALAMITARE STRUMENTALI | € 5.000,00 | € 1.500,00 | € -3.500,00 |
| 10 | SPESE PUBBLICITÀ E D.BX AVVP | € 1.000,00 | € 2.350,00 | € 1.350,00 |
| 12 | I.V.A. 22% SU VOCE (a1) | € 72.495,99 | € 57.467,26 | € -15.028,73 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 120.468,21 | € 78.829,28 | € -41.638,93 |
| | RIBASSO D'ASTA | | € 138.480,20 | € 27.501,18 |
| | SOMME ACCANTONATE E RIRIPROGRAMMATE | | | |
| | ACCANTONAMENTO 10% (art.7 comma 3 dell'art.470) | | € 45.000,00 | |
| | ACCANTONAMENTO 10% (art.7 comma 3 dell'art.470) | | € 45.000,00 | |
| | TOTALE SOMME : | | € 110.000,00 | € -110.000,00 |
| | TOTALE IMPORTO FINANZIATO | € 450.000,00 | € 450.000,00 | € 0,00 |
| | TOTALE IMPORTO PREVISIONE DI SPESA | € 450.000,00 | € 450.000,00 | € 0,00 |

Per quanto concerne la durata dei lavori, alla luce dello stato d'avanzamento attuale e relativo ai lavori del contratto originario, si ritiene che possano essere ultimati con un tempo contrattuale che viene calcolato proporzionalmente in ulteriori gg.35, che sommati ai 180 gg. contrattualmente previsti determinano un totale di gg.215.

Di conseguenza è stato predisposto anche lo schema dell'Atto di Sottomissione e il Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi sottoposti alla Ditta per la firma e accettazione dei lavori supplementari.



Oltre alla presente relazione tecnica, gli allegati che fanno parte integrante della presente perizia di variante sono:

- Elaborati grafici;
- Computo Metrico Estimativo e Stima Sicurezza;
- Quadro Economico Comparativo;
- Schema Atto Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- Documentazione Amministrativa.

Pescara, li 21 NOV. 2015

IL PROGETTISTA

(F.E.I. Bruno Baldonero)


IL PROGETTISTA E RUP
(ing. Silvio Iarvese)




REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA
UFFICIO TECNICO DI PESCARA

PAR FAS Abruzzo 2007 - 2013


Linea di Azione IV.2.1.a

"Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale"

Intervento 2

"Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali"

| | | | |
|---|--------------|---|--|
| TITOLO INTERVENTO: | | Rafforzamento e riprofilatura argini e interventi di ingegneria naturalistica sul Fiume Pescara in località "Salvatezzi" nel comune di Chieti (CH).- | |
| -CUP:-c72j12000190001 | | -CIG:-5814820d40 | |
| -IMPORTO LAVORI ORIGINARI AL NETTO DEL RIB. DEL 34,85% € 218.556,74.= | | -IMPORTO LAVORI VARIANTE AL NETTO DEL RIB. DEL 34,85% € 261.170,72.= | |
| PERIZIA DI VARIANTE | | | |
| Elaborati Grafici | | | |
| Elab. | 2 | | |
| Visto: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Ing. Vittorio Di Biase) | | <i>[Signature]</i> | |
| <i>[Signature]</i> | | - Ing. Silvio Iervese | |
| | | - F.E.T. Bruno Baldonero | |
| IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: | | <i>[Signature]</i> | |
| - Ing. Silvio Iervese | | | |
| Data: | 21 NOV. 2016 | Prot.: | |

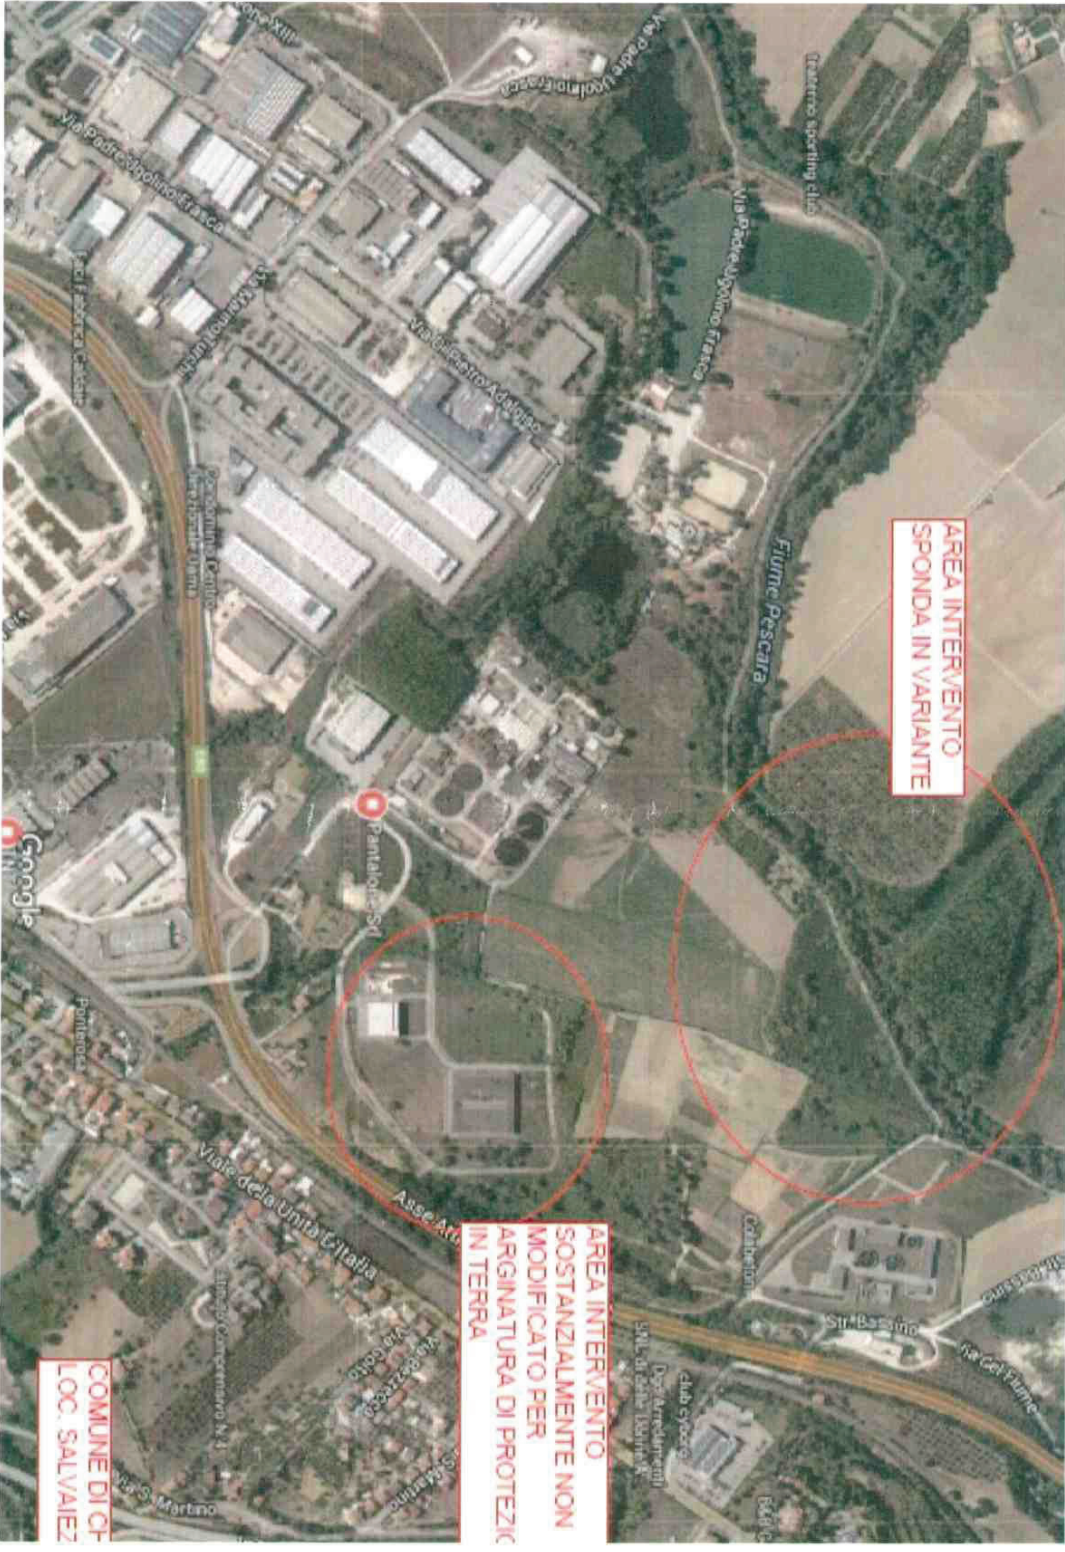

AREA INTERVENTO
SPONDA IN VARIANTE


AREA INTERVENTO
SOSTANZIALMENTE NON
MODIFICATO PER
ARGINATURA DI PROTEZIONE
IN TERRA

COMUNE DI CH
LOC. SALVAIEZ



INTERVENTO PER
RICOSTRUZIONE SPONDA
E RELATIVO RINFORZO


COMUNE DI
LOC. SALV

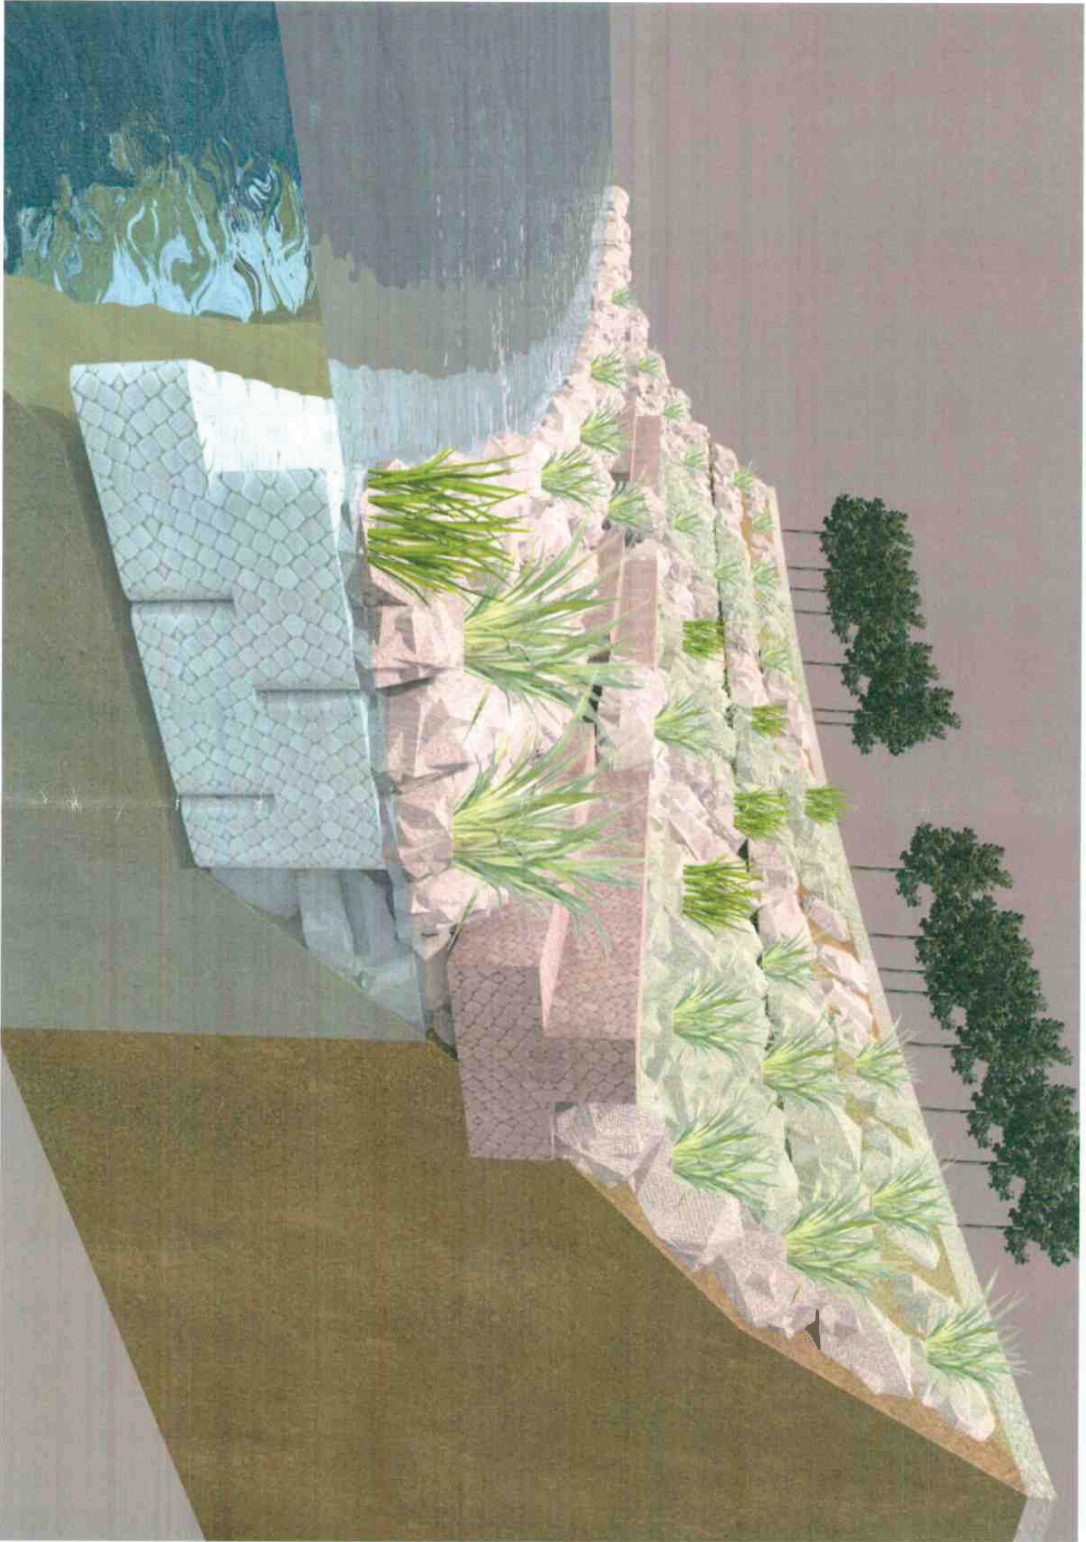

PROGETTO
Prospetto tipo opera finita
Scala 1:100
 rimodellazione sponda DX



Livello piano di campagna

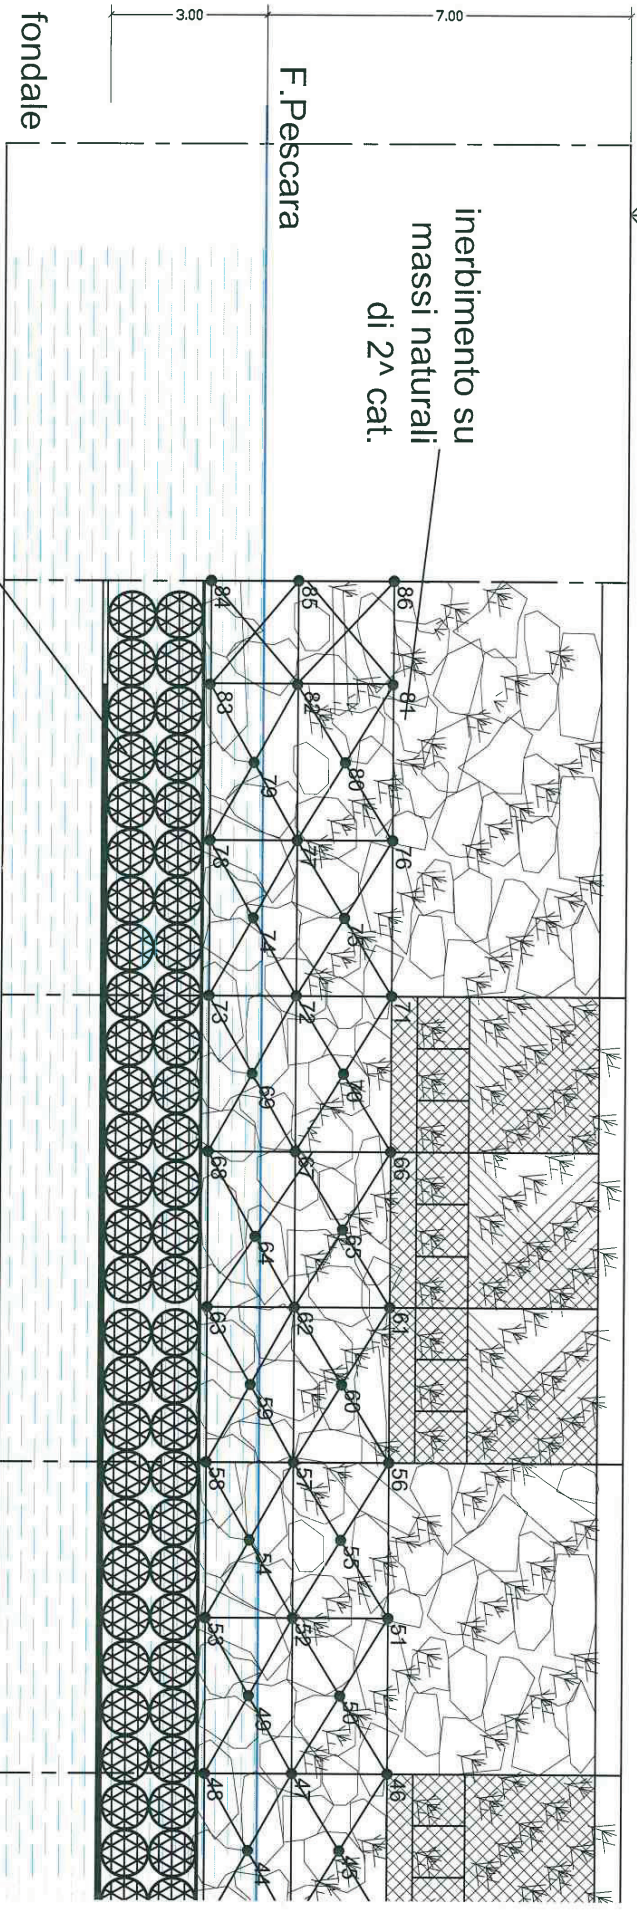

inerbimento su
 massi naturali
 di 2^a cat.

F. Pescara

fondale

Gabbioni
 cilindrici
 2.00x0.91

intervent


0 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00

PROGETTO Sezione 4 sponda DX

PROGETTO Sezione 3 rafforzamento sponda DX

PROGETTO Sezione 2 rafforzamento sponda DX

PROGETTO Sezione 1 rafforzamento sponda DX

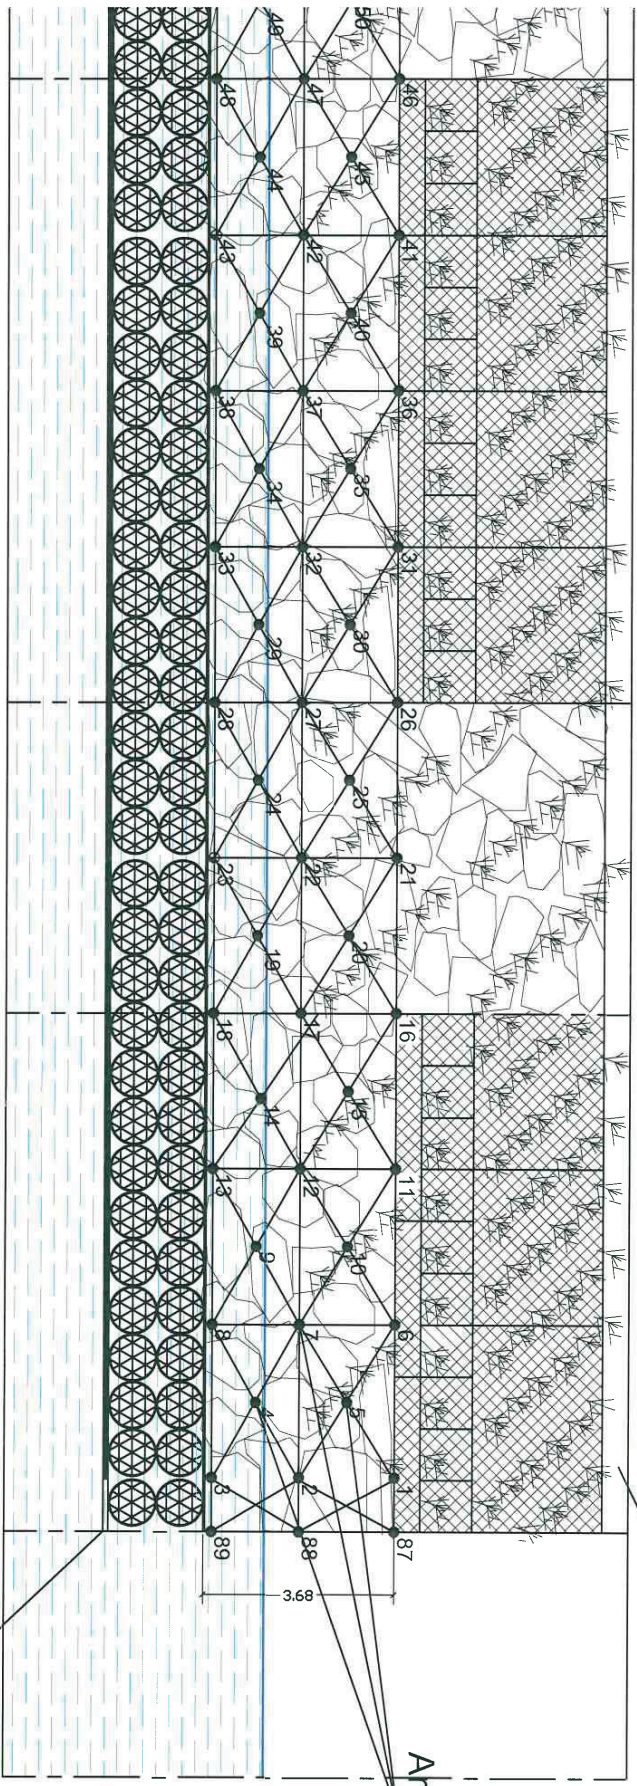

tout-venant
e/o misto cava

Ancoraggi con funi
e golfari

Guaina TNT

51,00

intervento in variante

PROGETTO
Sezione 1
Scala 1:100
rafforzamento sponda DX

tout-venant/misto cava

Rafforzamento con massi di
2^a cat. legati con funi


Gabbioni cilindrici 2.00x0.91

F. Pescara


Semina con
terreno e
verde

Guaina TNT


Sponda DX

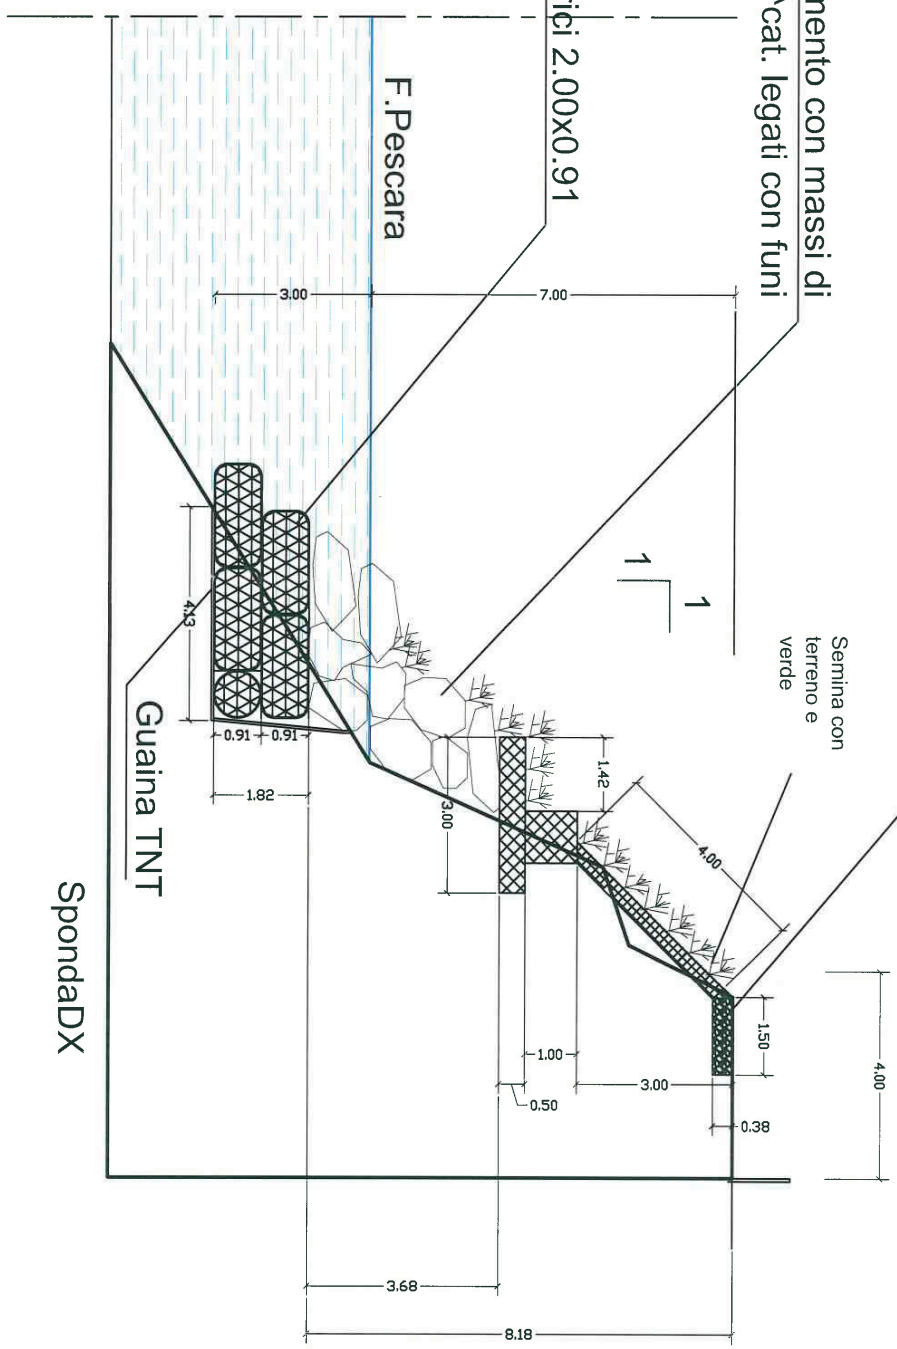


PROGETTO
Sezione 2
Scala 1:100
rafforzamento sponda DX

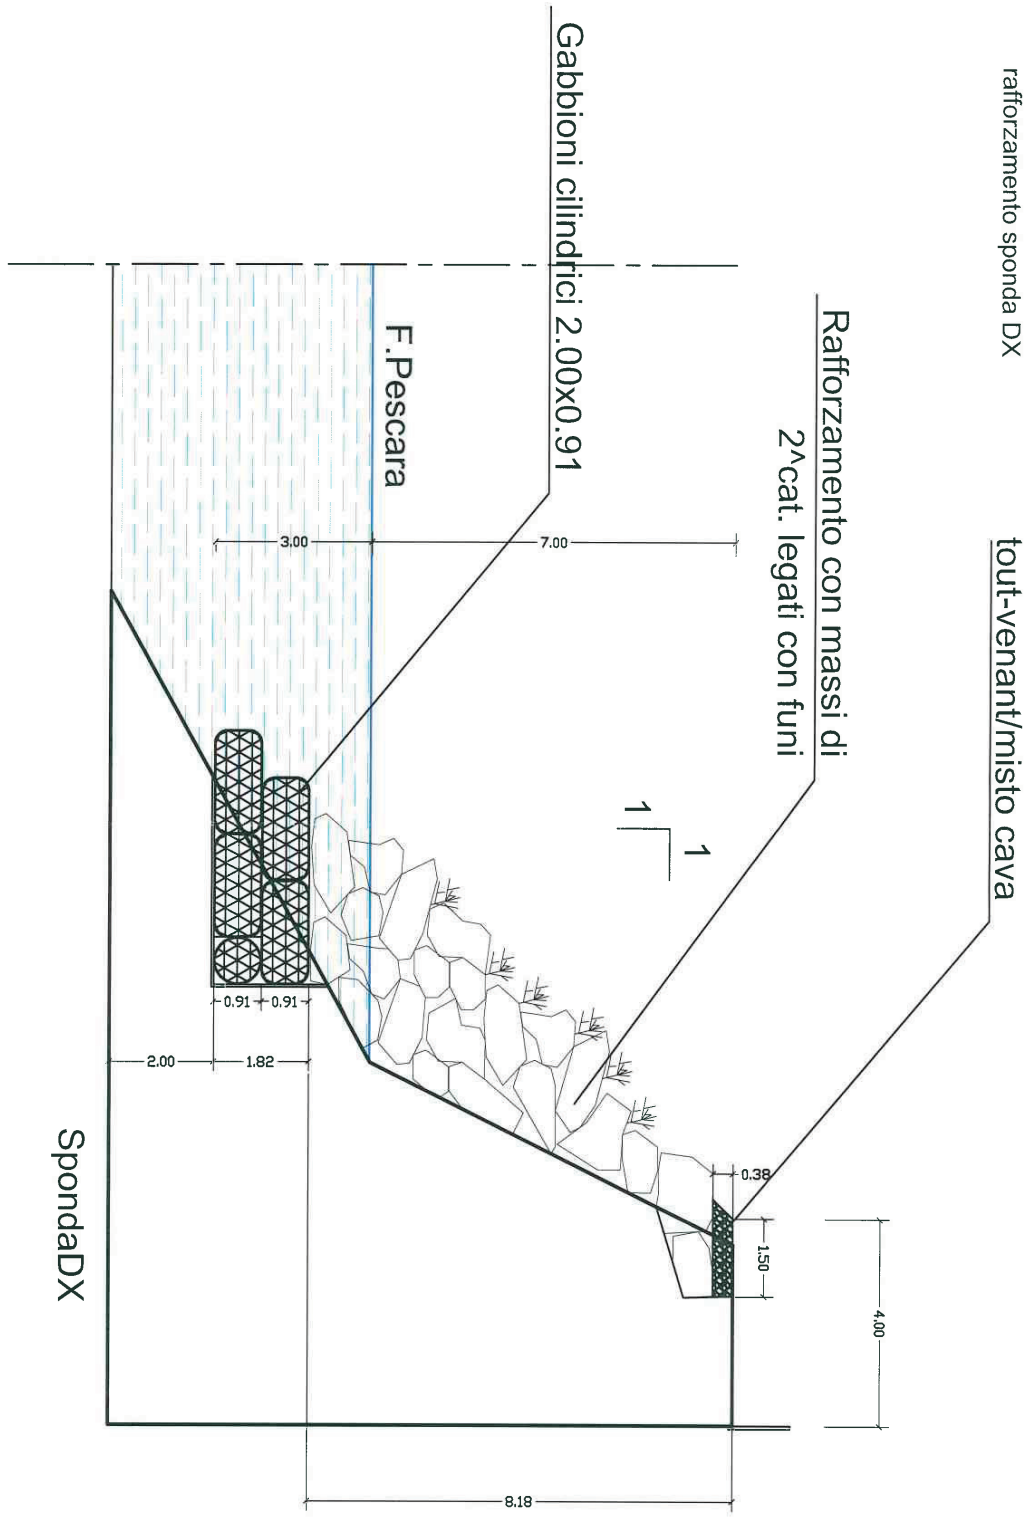


PROGETTO
Sezione 3
Scala 1:100
rafforzamento sponda DX

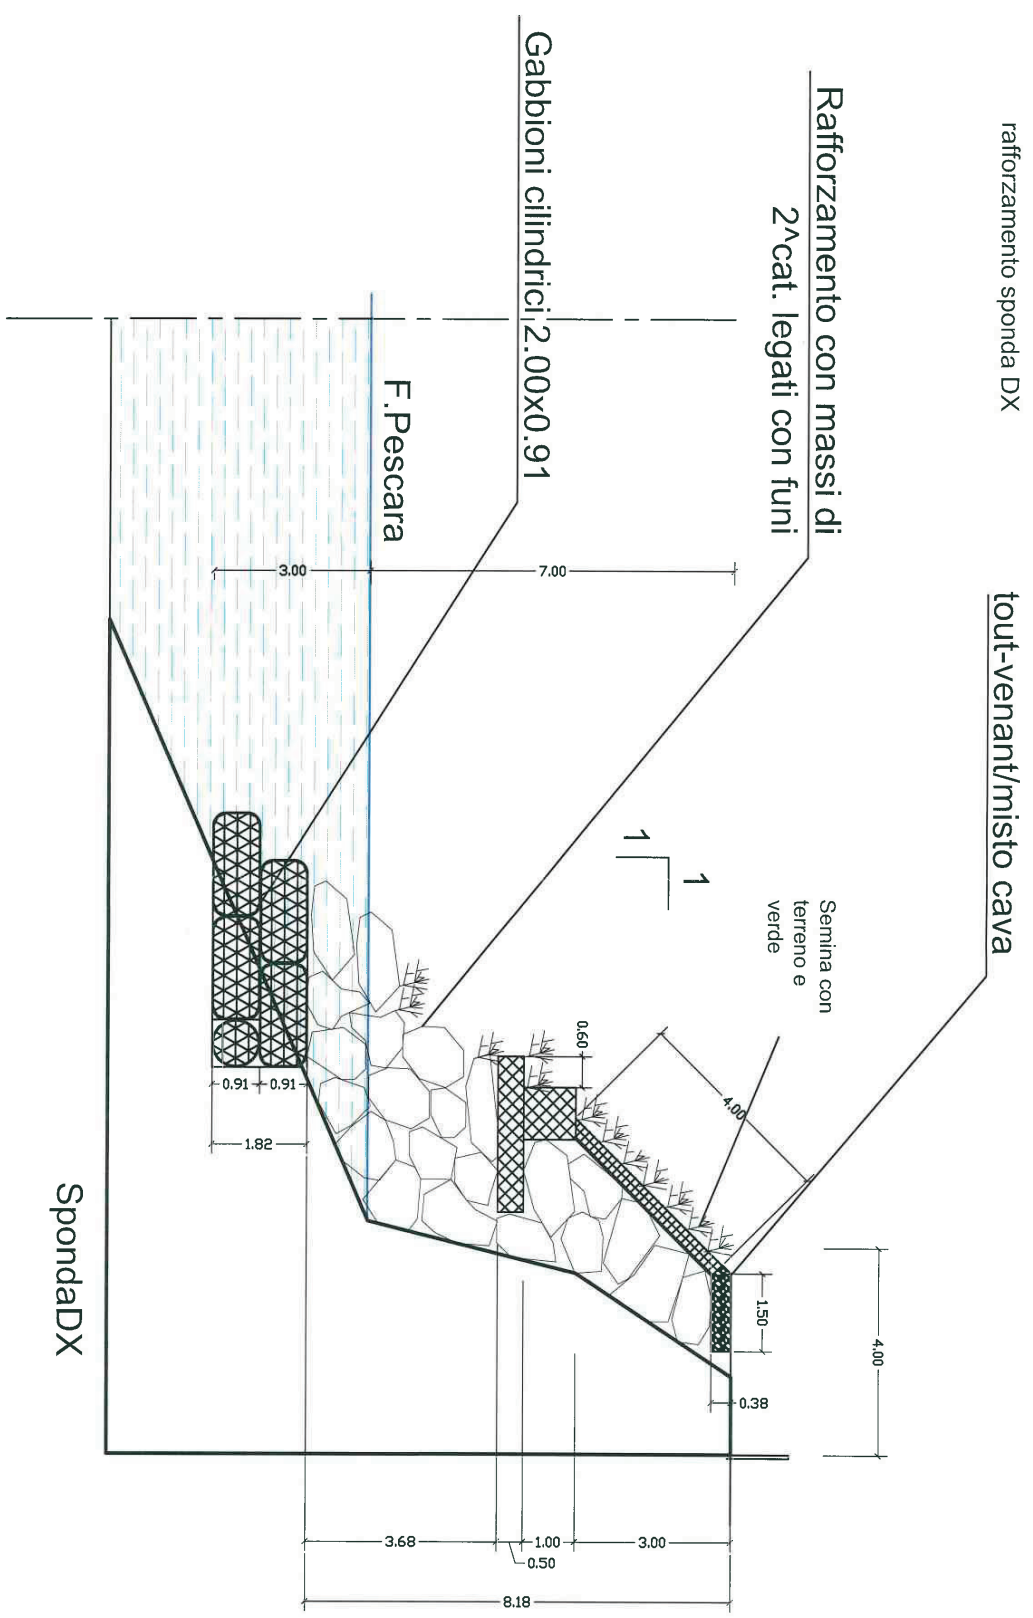

PROGETTO
Sezione 4
Scala 1:100
rafforzamento sponda DX

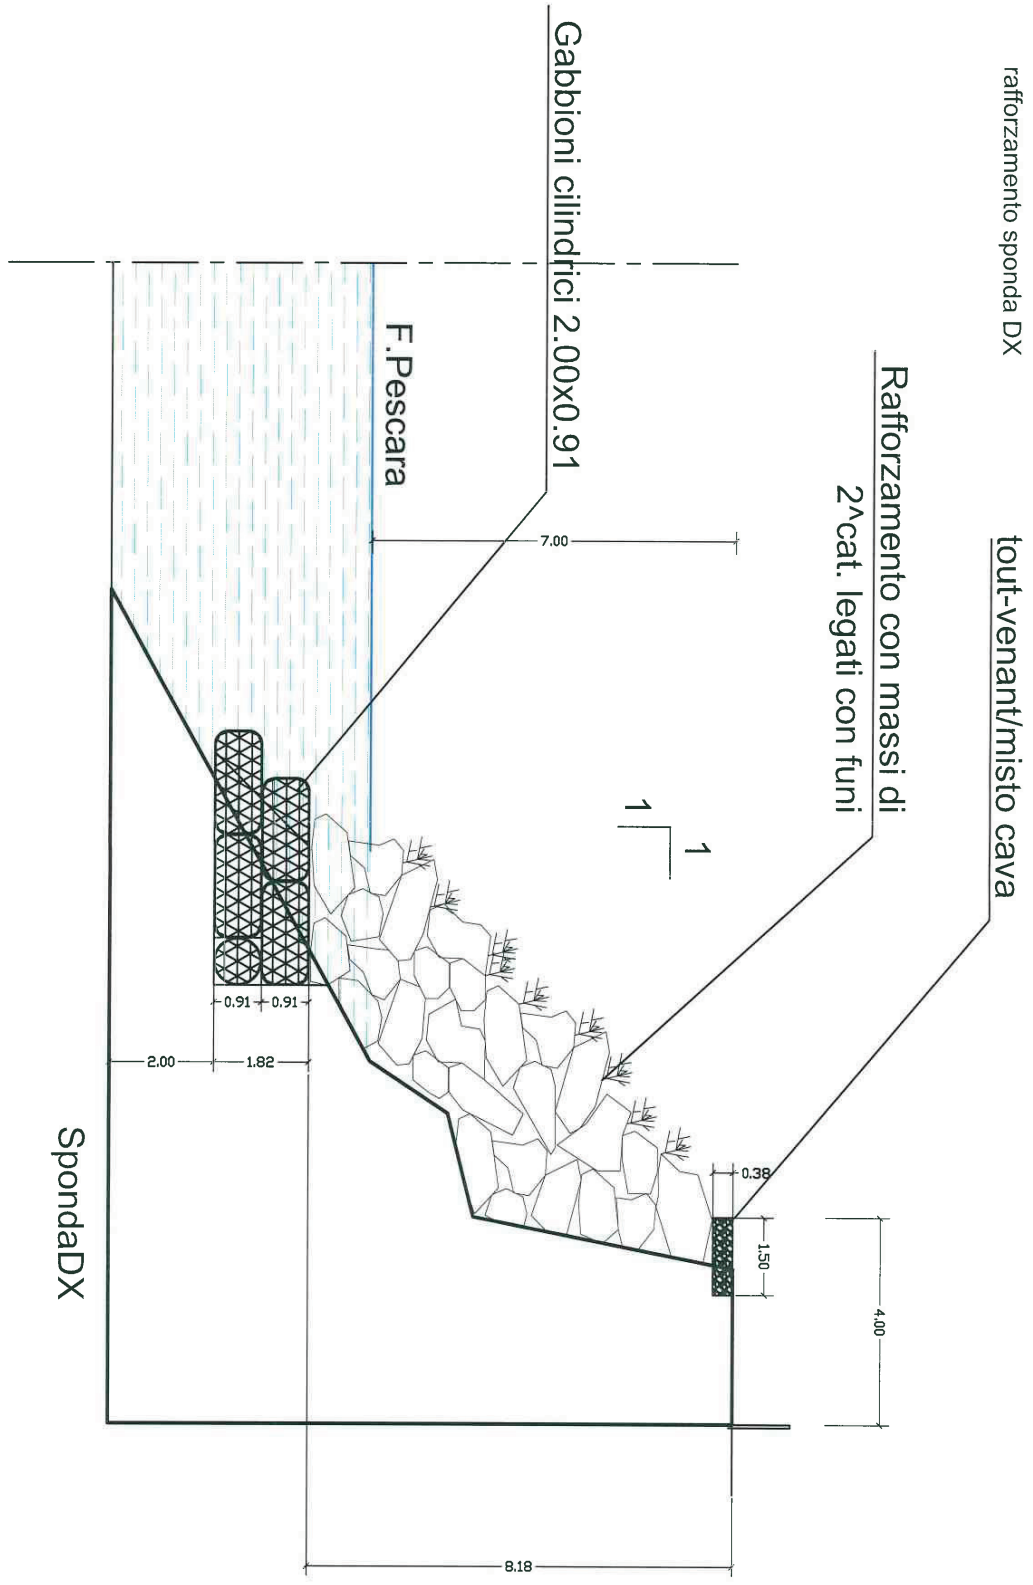

PROGETTO
Sezione 6
Scala 1:100
rafforzamento sponda DX

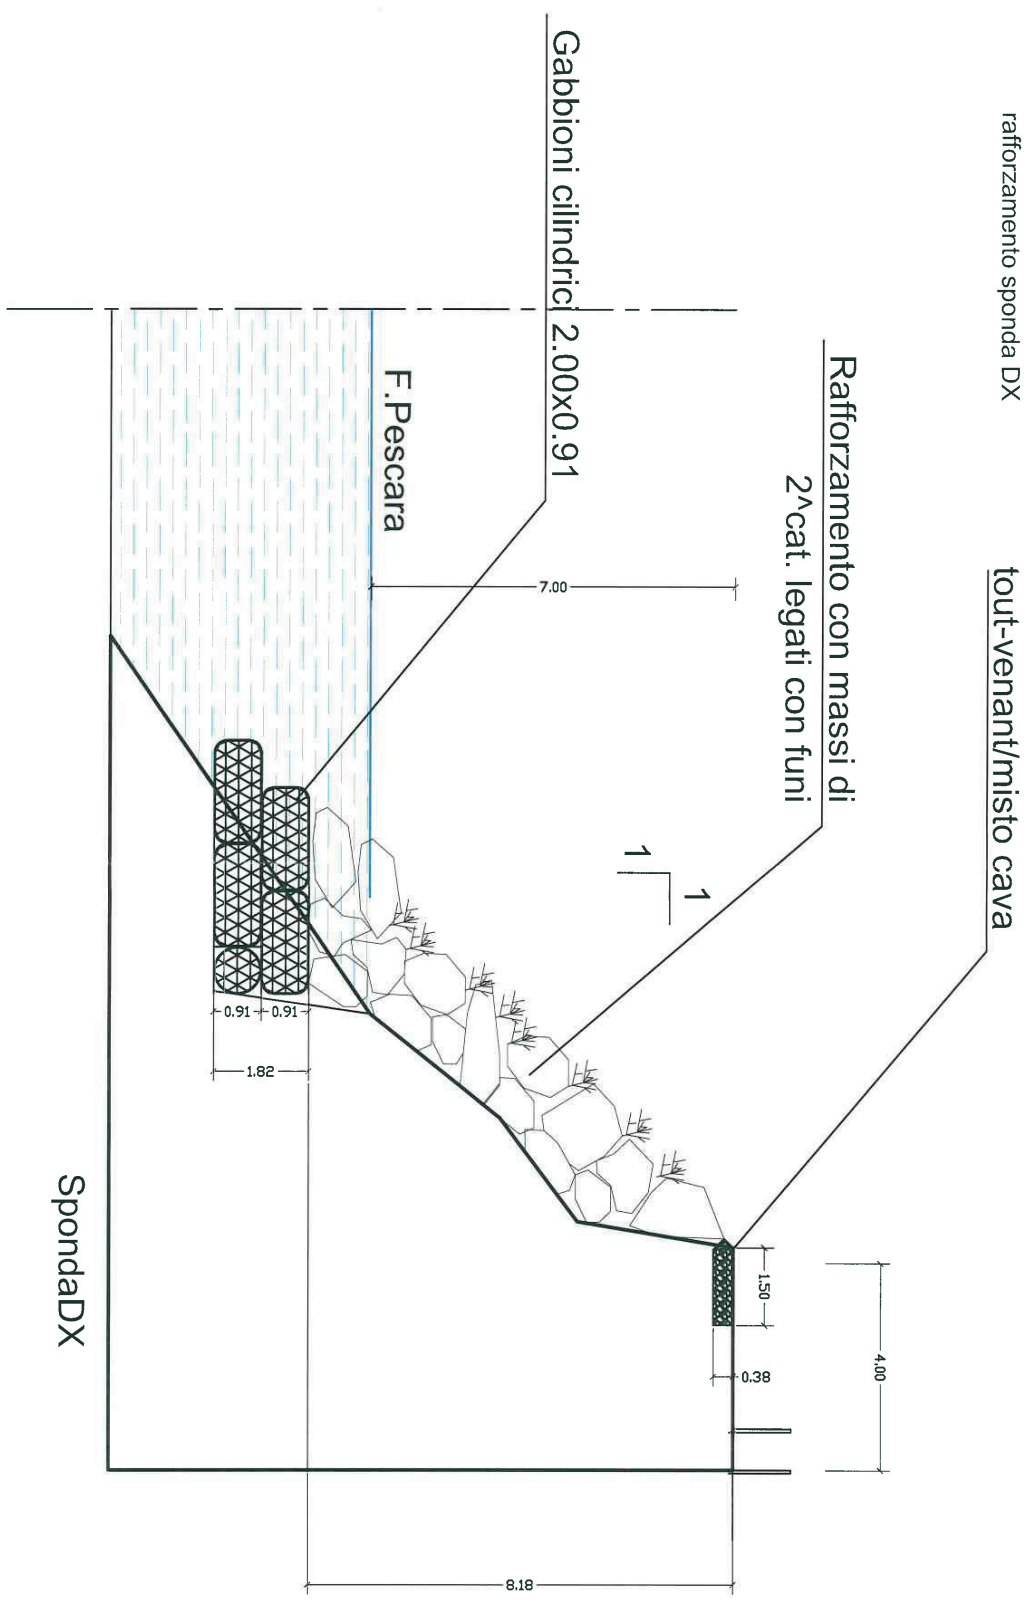

SpondaDX



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA
UFFICIO TECNICO DI PESCARA

PAR FAS Abruzzo 2007 - 2013

Linea di Azione IV.2.1.a
"Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale"

Intervento 2
"Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali"

| | | |
|---|--|---|
| TITOLO INTERVENTO: | Rafforzamento e riprofilatura argini e interventi di ingegneria naturalistica sul Fiume Pescara in località "Salvaiezzi" nel comune di Chieti (GH) - -CUP:c72j12000190001 -CIG:5814820d40 -IMPORTO LAVORI ORIGINARI AL NETTO DEL RIB. DEL 34,85% € 218.556,74 = -IMPORTO LAVORI VARIANTE AL NETTO DEL RIB. DEL 34,85% € 261.170,72 = | |
| PERIZIA DI VARIANTE | | |
| Elab. | 3 | Computo Metrico Estimativo e Stima Sicurezza |
| Visto: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Ing. Vittorio Di Biase) | IL PROGETTISTA: - Ing. Silvio Iervese - F.E.T. Bruno Baldonero IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Ing. Silvio Iervese | |
| Data: | 21 NOV 2013 | Prot.: |



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA
UFFICIO TECNICO DI PESCARA

PAR FAS Abruzzo 2007 - 2013

Linea di Azione IV.2.1.a

"Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale"

Intervento 2

"Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali"

| | | |
|--|--|--------|
| TITOLO INTERVENTO: | Rafforzamento e riprofilatura argini e interventi di ingegneria naturalistica sul Fiume Pescara in località "Salvaiezzi" nel comune di Chieti (CH). -CUP:c7212000190001 -CIG:5814820d40 -IMPORTO LAVORI ORIGINALI AL NETTO DEL RIB. DEL 34,85% €. 218.556,74.= -IMPORTO LAVORI VARIANTE AL NETTO DEL RIB. DEL 34,85% €. 261.170,72.= | |
| PERIZIA DI VARIANTE | | |
| QUADRO ECONOMICO | | |
| Elab. | 4 | |
| Visto: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Ing. Vittorio Di Biase) | <p><i>Modifica di cui al parere n° 1588 del 04/02/2016 - Ministero Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle arti e Paesaggio dell'Abruzzo</i></p> <p>IL PROGETTISTA: - Ing. Silvio Iervese _____ - F.E.T. Bruno Baldonero _____</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - Ing. Silvio Iervese _____</p> | |
| Data: | 21 NOV. 2016 | Prot.: |

| QUADRO ECONOMICO | | PROGETTO ESECUATIVO | PERIZIA DI VARIANTE | DIFFERENZA MAG/MIN | |
|------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| A) | LAVORI | | | | |
| a1 | LAVORI A MISURA | € 329.531,79 | € 394.650,92 | € 65.119,13 | 19,8% |
| a2 | ONERI SICUREZZA (non soggetto a rib.) | € 11.095,48 | € 11.637,42 | € 541,94 | |
| | IMPORTO CONTRATTUALE (rib.34,85%) | € 218.556,74 | € 261.170,72 | € 42.613,98 | 19,5% |
| B) | SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | |
| 1 | LAVORI IN ECONOMIA | € 15.000,00 | € 0,00 | -€ 15.000,00 | |
| 2 | RILIEVI ACCERTAMENTI E INDAGINI | € 5.000,00 | € 0,00 | -€ 5.000,00 | |
| 4 | IMPREVISTI | € 5.380,58 | € 0,70 | -€ 5.379,88 | |
| 7 | SPESE ART.90 C.5 E 92 C.7BIS D.LGS. 163/2006 | € 6.590,64 | € 7.893,02 | € 1.302,38 | |
| 7" | SPESE TECNICHE+ASSICURAZ. DIPEND. | € 5.000,00 | € 4.978,00 | -€ 22,00 | |
| 7''' | SPESE DI CARATTERE STRUMENTALI | € 5.000,00 | € 7.500,00 | € 2.500,00 | |
| 10 | SPESE PUBBLICITA' E D EX AVCP | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | |
| 12 | I.V.A. 22% SU VOCE (a1) | € 72.496,99 | € 57.457,56 | -€ 15.039,44 | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 120.468,21 | € 78.829,28 | -€ 41.638,93 | |
| | RIBASSO D'ASTA | € 110.975,05 | € 133.480,20 | € 22.505,15 | |
| | SOMME ACCANTONATE E RIPROGRAMMATE: | | | | |
| | ACCANTONAMENTO 10% (art.7 comma 3 dell'articolo APQ) | | € 45.000,00 | | |
| | IMPORTO PER RIPROGRAMMAZIONE (DEC. GIU. REG.) | | € 65.000,00 | | |
| | TOTALE SOMME : | | € 110.000,00 | € 110.000,00 | |
| | TOTALE IMPORTO FINANZIATO | € 450.000,00 | € 450.000,00 | € 0,00 | |
| | TOTALE IMPORTO PREVISIONE DI SPESA | € 450.000,00 | € 450.000,00 | € 0,00 | |
